


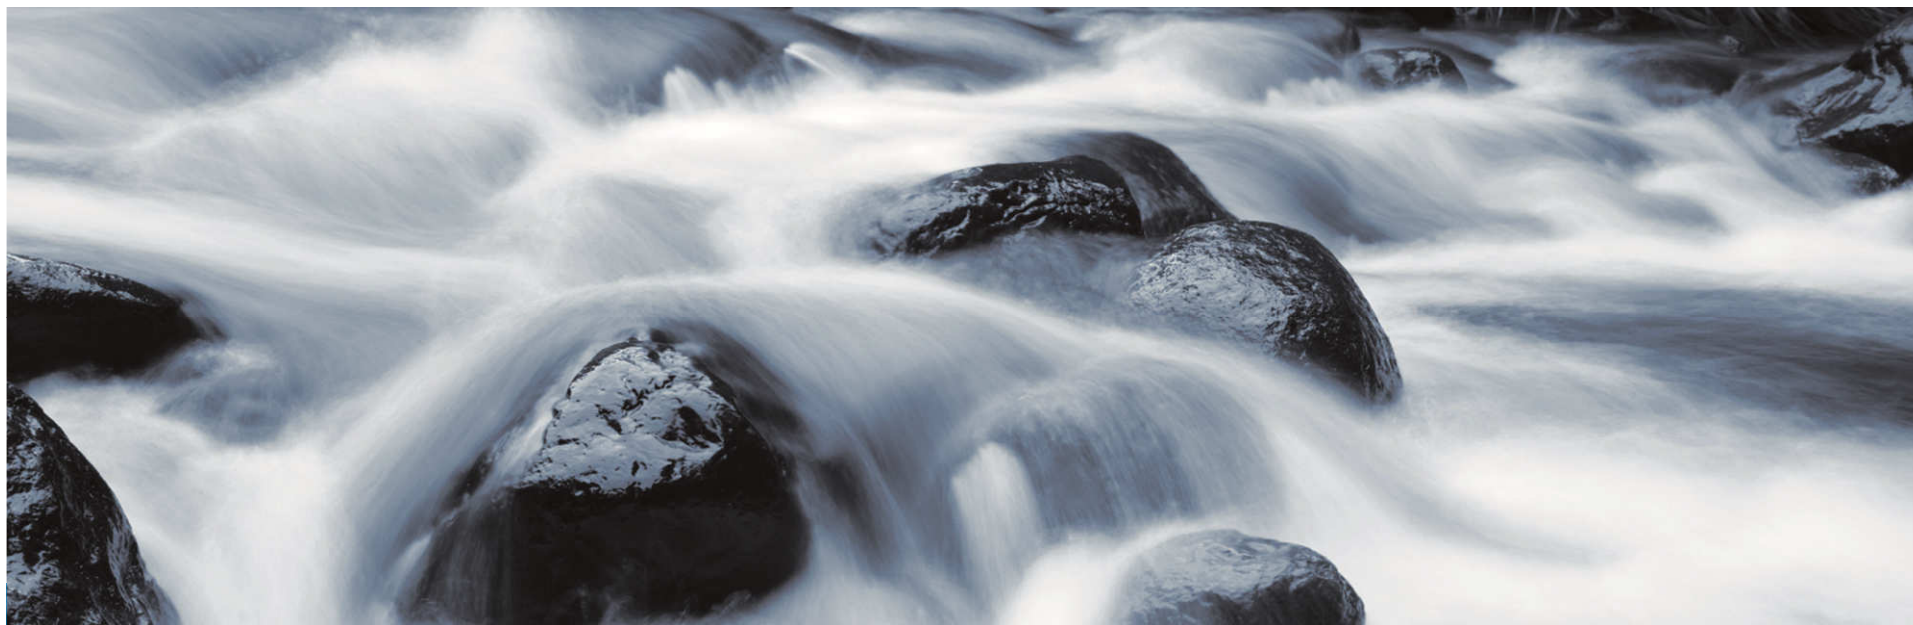

**PROBLEMY REGIONALNYCH ZARZĄDÓW GOSPODARKI WODNEJ W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI PROJEKTÓW
DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

**USTRÓŃ, CZERWIEC 2010 R.
DAMIAN PAZIO**

PROBLEMY REGIONALNYCH ZARZĄDÓW GOSPODARKI WODNEJ W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Programy operacyjne, w ramach których rzgw przygotowują projekty

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 - a) Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
 - Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
 - b) Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
 - Działanie 5.2 Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych
 - c) Priorytet VII Transport przyjazny środowisku
 - Działanie 7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych
2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 - a) Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
 - Działanie 6.4 Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
3. Regionalne Programy Operacyjne

PROBLEMY REGIONALNYCH ZARZĄDÓW GOSPODARKI WODNEJ W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

„Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (polder)”

1. Tytuł prawny do terenu w czaszy zbiornika

- pozwolenie na budowę => wymóg dysponowania tytułem prawnym do nieruchomości obejmujących obszar całego obiektu budowlanego
- czasza zbiornika => powierzchnia ok. 26 km²; duża liczba działek; zróżnicowane wykorzystanie (gospodarka rolna, wydobywanie kruszywa) => długotrwały i skomplikowany proces pozyskiwania gruntów => wstrzymanie procesu inwestycyjnego
- projekt ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych => uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego

PROBLEMY REGIONALNYCH ZARZĄDÓW GOSPODARKI WODNEJ W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

2. Pozwolenia na budowę dla poszczególnych obiektów zbiornika

- pozwolenie na budowę => wymóg dysponowania tytułem prawnym do nieruchomości obejmujących obszar obiektu budowlanego
- nieuregulowany stan prawny działek, ustalenie właścicieli, rozbieżności w dokumentach => ryzyko pomyłki przy ustalaniu stanu faktycznego => opóźnienie w wydaniu decyzji (pozwolenia na budowę); unieważnienie pozwolenia na budowę
- możliwość uzyskania odrębnych pozwoleń na budowę poszczególnych obiektów zbiornika => warunkiem zdolność wypełnienia przez te obiekty samodzielnych funkcji
- wykonanie oceny technicznej zdolności elementów składowych zbiornika do funkcjonowania jako odrębne urządzenia hydrotechniczne => wystąpienie z wnioskiem o wydanie odrębnych pozwoleń na budowę

PROBLEMY REGIONALNYCH ZARZĄDÓW GOSPODARKI WODNEJ W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

- załączniki do wniosku => wypis z ewidencji gruntów oraz kopia map ewidencyjnych obejmujących teren inwestycji oraz obszar jego negatywnego oddziaływania
- koszt zakupu arkuszy map i wypisów z ewidencji niewspółmierny do celu jaki mają spełnić
- ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (uchwalona dn. 21.05.2010 r.)
 - dla przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli => mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzonej w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 - nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów

PROBLEMY REGIONALNYCH ZARZĄDÓW GOSPODARKI WODNEJ W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Wybrane problemy regionalnych zarządów gospodarki wodnej

1. Wniosek o uruchomienie finansowania

- wniosek uwzględnia zapotrzebowanie na środki na najbliższe 3 miesiące
- złożona procedura weryfikacji wniosków (RZGW => KZGW => MŚ => MRR => MF)
- terminy weryfikacji i akceptacji wniosków przez poszczególne instytucje
- opóźnienia realizacji płatności w wymaganych terminach

PROBLEMY REGIONALNYCH ZARZĄDÓW GOSPODARKI WODNEJ W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

2. Zlecenie płatności

- 1 stycznia 2010 r. nowelizacja ustawy o finansach publicznych
- centralny podmiot płatniczy (Bank Gospodarstwa Krajowego)
- IW => upoważnienie => rzgw => zlecenie płatności => BGK => wykonawca
- umowa o dofinansowanie => upoważnienie
- umowa o dofinansowanie = pre-umowa
- upoważnienia do składania zleceń płatności

PROBLEMY REGIONALNYCH ZARZĄDÓW GOSPODARKI WODNEJ W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

3. Inne problemy

a) decyzje środowiskowe

- brak inwentaryzacji przyrodniczych dla obszarów Natura 2000
- przewlekła procedura administracyjna (uzgadnianie zakresu raportu, konsultacje społeczne)

b) procedury przetargowe

- brak ofert
- złożenie protestu

c) ewidencja gruntów

- rozbieżności w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym

PROBLEMY REGIONALNYCH ZARZĄDÓW GOSPODARKI WODNEJ W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

4. Zagrożenia

- brak możliwości wydatkowania zaplanowanych środków => zmiana planu rzeczowo-finansowego
- konieczność zawarcia aneksów do umów z wykonawcami
- opóźnienie względem harmonogramów
- narastanie opóźnień w dalszych fazach prac nad projektem
- niedotrzymanie terminów złożenia wniosku o dofinansowanie
- zagrożenie absorpcji środków w ramach danego programu operacyjnego
